

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI

Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano




MM Spa

C.U.P.: B46E18000360004

OGGETTO: Nuove opere e/o riqualificazione delle aree verdi comunali localizzate nei Municipi 2, 6, 7, 8 e 9. Bilancio Partecipativo anni 2015 e 2017 – Lotto 2 di 2

ATTI TECNICI PER ACCORDO QUADRO IN LOTTI

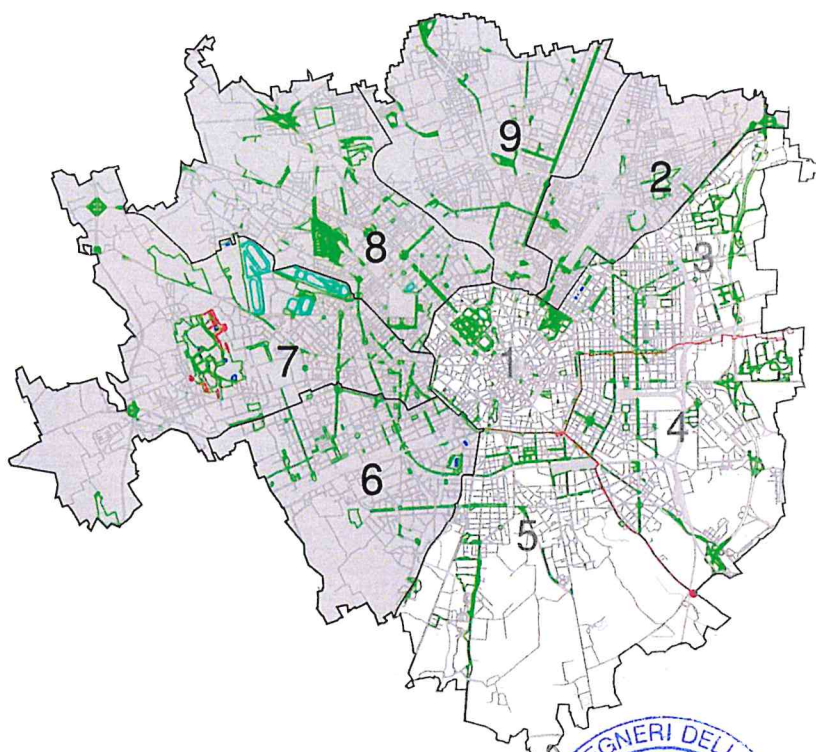

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Ing. Sara Spinas

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Paravati

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Paola Viganò

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO F – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

AQ.4

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ





È vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa



COMUNE DI MILANO

OGGETTO: Nuove opere e/o riqualificazione delle aree verdi comunali localizzate nei Municipi 2, 6, 7, 8 e 9. Bilancio Partecipativo anni 2015 e 2017 – Lotto 2 di 2
C.U.P.: B46E18000360004

ACCORDO QUADRO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLEGATO F: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL DIRETTORE TECNICO DOTT. ING. Francesco Veronesi Ordine degli Ingegneri di Milano N. 14647			IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. Sara Solinas Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 23723 Settore: A Settore: ambientale n° A 23723			
1	Novembre 2019	Accordo Quadro				S. Solinas
0	18/11/2019	Emissione	S. Solinas	S. Solinas	S. Solinas	S. Solinas
Aggiorn.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Acquisito	Approvato

COLLABORAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE:

CODIFICA DOCUMENTO	Commessa	Lotto	Fase	Categoria	Opera	Progressivo
	FT	1	E	Z	RE	004

PAGINE TOTALI 6



INDICE DEI CONTENUTI

1. Premessa.....	4
2. Elenco Delle Fasi Di Lavoro Previste	5
3. Cronoprogramma dei lavori	6



1. PREMESSA

Il presente allegato dovrà contenere il Cronoprogramma dei Lavori redatto a cura del CSE. Contestualmente a ciascun Contratto Applicativo, il CSE dovrà predisporre il presente **Allegato F** tenendo conto delle ipotesi di avanzamento dei lavori e di gestione del cantiere svolte dal gruppo di progettazione.

Il documento dovrà inoltre essere utilizzato come punto di partenza per l'individuazione delle potenziali interferenze fra le lavorazioni previste a progetto.

Sarà comunque onere dell'Impresa Affidataria redigere un proprio Cronoprogramma dei Lavori, che dovrà essere coerente con le ipotesi di avanzamento previste in sede di progetto. Il Cronoprogramma dei Lavori redatto dall'Impresa dovrà essere rispettoso dei vincoli temporali intermedi e finali definiti all'interno del contratto e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, secondo un livello di approfondimento ed una cadenza temporale che saranno definite sulla base di quanto riportato nei documenti progettuali e contrattuali e sulla base di più specifiche richieste che potranno essere effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ognuno per le relative competenze.

L'aggiornamento del Cronoprogramma redatto dall'Impresa e la congruità dello stesso rispetto alle ipotesi progettuali saranno valutati nel corso di apposite riunioni di coordinamento finalizzate alla verifica dei percorsi critici, che si terranno alla presenza del DL e del CSE. Sarà onere dell'Impresa Affidataria del presente appalto quello di provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori in funzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno richieste dal DL e dal CSE, ai quali spetterà l'approvazione finale del nuovo documento prodotto.

Sarà inoltre onere dell'Impresa Affidataria la predisposizione di uno stralcio delle fasi di dettaglio dei lavori previste nel Cronoprogramma dei Lavori ai fini dello svolgimento delle riunioni di coordinamento della sicurezza che avverranno con cadenza periodica, definita dal CSE. Tali stralci del documento saranno oggetto di discussione ai fini della valutazione delle possibili interferenze lavorative e delle relative modalità di mitigazione e costituiranno allegato al verbale di riunione di coordinamento.

Le modifiche che, a livello generale, potranno essere apportate al Cronoprogramma dei Lavori costituiranno a tutti gli effetti motivo di aggiornamento del presente allegato.

2. ELENCO DELLE FASI DI LAVORO PREVISTE

Per ogni Contratto Applicativo, nel presente capitolo, il CSE dovrà elencare, in funzione del Cronoprogramma, il dettaglio delle fasi e sotto fasi di lavoro.



3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per ogni Contratto Applicativo, nel presente capitolo, il CSE dovrà allegare il cronoprogramma dei lavori.

